

## M様別荘ウッドデッキ他工事報告書 その④

今週月曜日までに以下の様に工事をさせて頂きました。

釘の浮いた壁へのビス打ち作業



板と板の継ぎ目及びひび割れ部分のシリコン打ち





キツツキの開けた穴の塞ぎ作業



キツキが痛めた外壁の補修作業








キツキが痛めた東南角の丸柱の補修作業



日々や傷の深い部分はバックアップ材を入れます。↑

表面のバリを取る為に軽くサンダーを掛けます↓

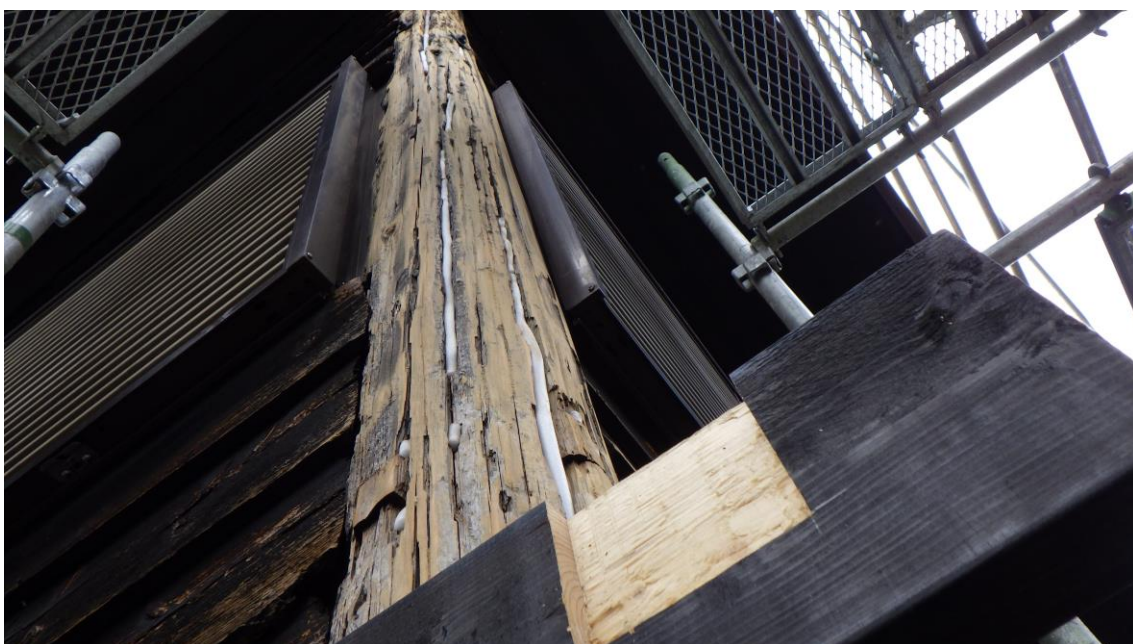



ヒビや傷んだ部分にシリコンを打っていきます。↓



シリコンが固まったら塗装して完了です。





キズ等の補修にはウッドコークを使う事もありますが、今回は屋外で雨が当たる可能性がある箇所でしたので、耐久性の面からシリコンを打たせて頂きました。

蜂の巣の後撤去及び塗装作業








屋根塗装工事

作業前の錆の様子

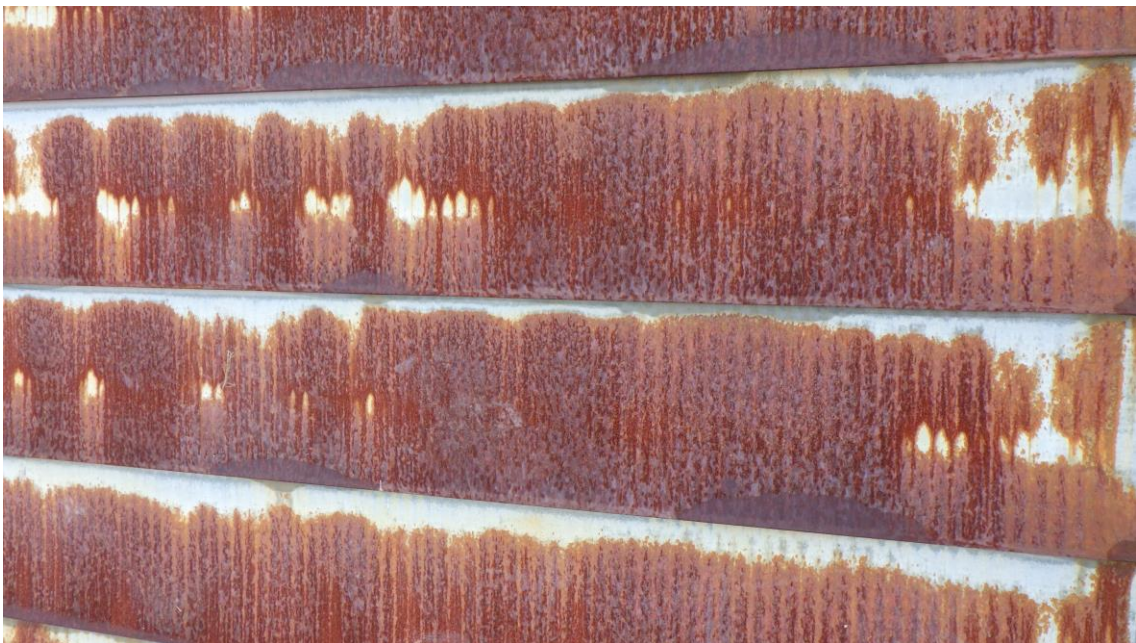



さび落とし作業（実施後←左、実施前→右）







※なお足場についてですが、当初は北側にも設置する予定でしたが、下方に足場をつくるよりロープを垂らして確保した方が安全という事で、東西面の足場を高く組んで確保の支点を十分に造らせて頂きました。



屋根錆止め塗装作業







破風鼻隠し・唐草塗装作業












屋根・折り目（つなぎ目）部分の塗装作業

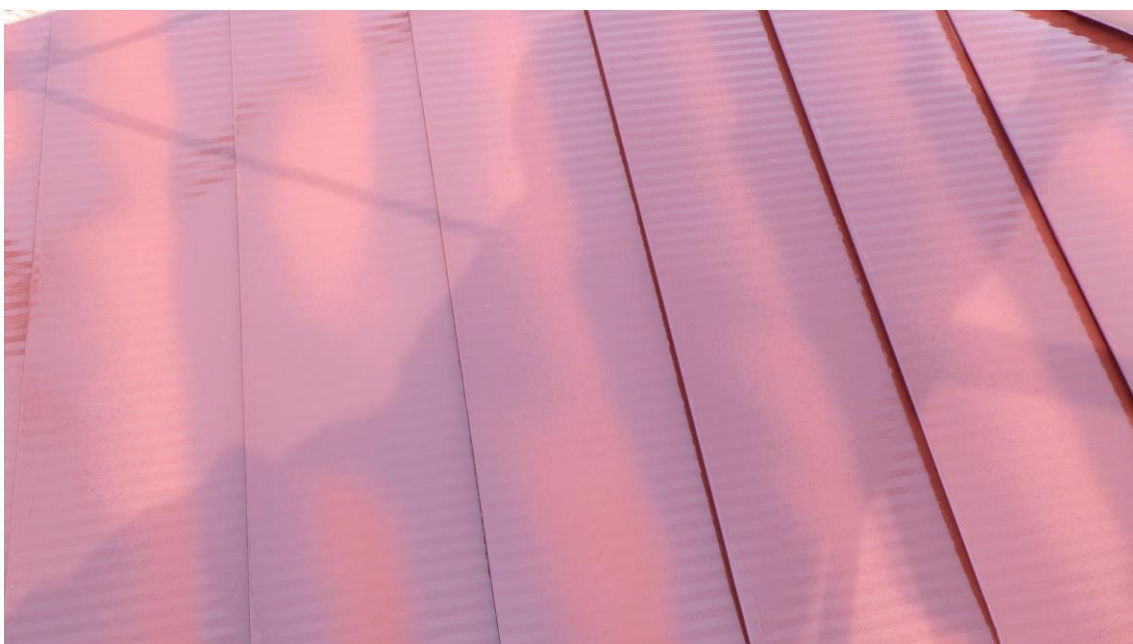




上塗り（仕上げ）塗装作業





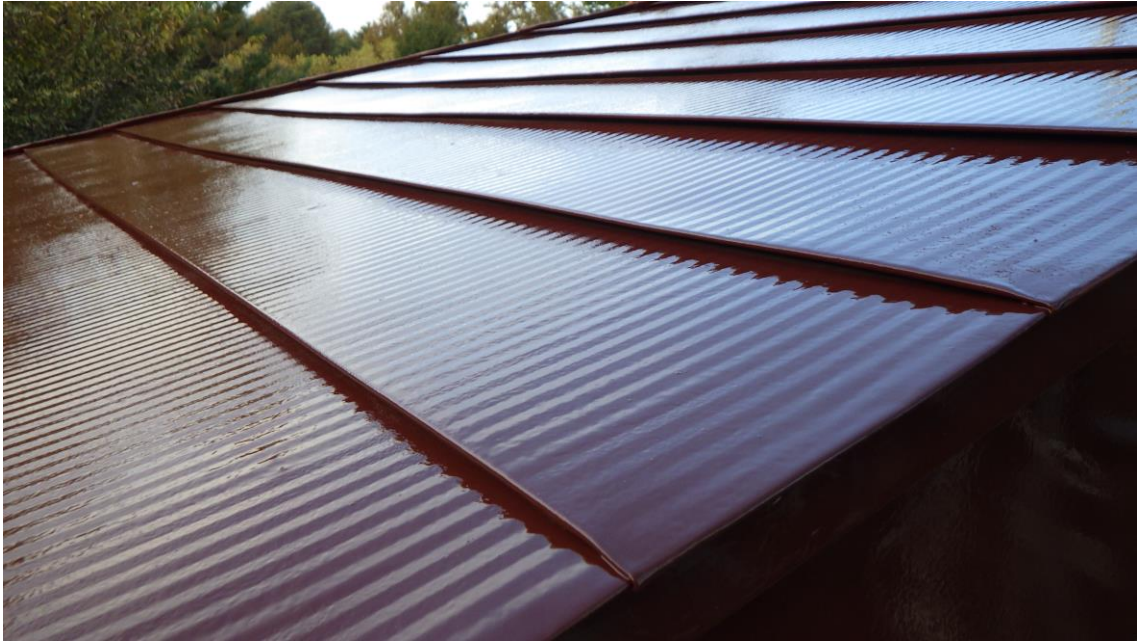





外壁塗装







外壁塗装 2回目







玄関塗装（2度塗り後）



写真を撮り忘れましたが灯油タンクも塗装させて頂きました。  
報告は以上です。

2022年11月1日  
アトリエブフィエ  
清水正浩
